
REPÚBLICA DEL PERÚ



Seguimiento a los Proyectos Financiados parcialmente con Endeudamiento Externo

Ministerio de Economía y
Finanzas

Ministerio de Salud
PARSALUD II

REVISION 2011-I
Febrero 2011



1.- Información General

Nombre del Pliego	MINISTERIO DE SALUD	
Nombre de la UE	UE 135 PROGRAMA APOYO REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD	
Nombre de la Fuente de Financiamiento	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO – ROOC RECURSOS ORDINARIOS – RO	
Nombre del Proyecto o Programa	SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD – PARSALUD II	
Código SNIP	056-2005	
Contrato de Préstamo (CP)	CONTRATO BID: N° 2092/OC-PE CONTRATO BIRF: N° 7643-PE	
Fecha de Firma del Contrato	16 DE NOVIEMBRE DEL 2009	
Fecha de Entrada en Efectividad	BID: 16 NOVIEMBRE 2009 BM: 15 DICIEMBRE 2009	
Fecha del Primer Desembolso	Desembolso BID: 15 de diciembre 2009 Desembolso BM: 19 de noviembre 2010	
Fecha Final de Desembolsos (Original)	16 de noviembre del 2014	
Fecha Final de Desembolsos (Vigente)	16 de noviembre del 2014	
Nombre del Jefe de la UE	PAULINA GIUSTI HUNDSKOPF	
Teléfono:	Central: 6118181 Fax: Anexo 210	Email: pgiusti@parsalud.gob.pe



Seguimiento acuerdos revisión anterior

Pendientes	Avances
La UE, con apoyo de DNEP, informará a Cusco y Cajamarca que no se están detrayendo sus recursos para el pago de la contrapartida ni para el servicio de la deuda.	Con oficios 978-2010 y 002-2011-PARSALUD/CG se envió a Cusco y Cajamarca copia del oficio 547-2010-EF/75.22.01 en que DNEP afirma que no se están detrayendo recursos de Cusco y Cajamarca para pago de contrapartida ni servicio de deuda.
PARSALUD continuará con la estrategia de difusión de la convocatorias para asegurar óptima cantidad de postores	Se continúa difundiendo, adicionalmente los medios oficiales (DGMarket, UNDB y diarios), a través de GRs, SEACE, CAPECO (obras y supervisión) y Cámara de Comercio de Lima (equipos)
La UE enviará a BM la solicitud de desembolsos la primera semana de noviembre	Solicitud enviada el 3 de noviembre. Desembolso recibido el 17 de noviembre
Recomponer Comité Directivo (por cambio en Viceministerio)	Mediante RM Nº 827-2010/MINSA, del 25 de octubre de 2010, se designó a la VM de Salud, Dra. Zarela Solís, Presidenta Titular del Comité Directivo del Programa de PARSALUD II, y a la Dra. Faria Bernui como su alterna. El Comité ha aprobado ya el POA 2011 de PARSALUD.

2.- Avance Físico (1)

Objetivo Central (Propósito)	Indicador	Descripción	Valor Basal (2008) (1)	Meta al 2014 (2)	Avance Acumulado (2009) (3)	% de avance	Observaciones
Contribuir a la reducción de la mortalidad materna neonatal y la desnutrición crónica de los niños y niñas de 3 años, de familias de las 9 regiones más pobres del Perú	Porcentaje de parto institucional rural	Porcentaje de partos atendidos en EESS, en el ámbito rural	48,7	78	58,8	34,6	
	Tasa de mortalidad neonatal	Número de muertes neonatales por 1000 nacidos vivos	16	11	14	40,0	
	Prevalencia de desnutrición crónica en >3ª (OMS)	Porcentaje de niños <3 a con desnutrición crónica	39,6	30,2	35,2	46,8	

(1) Encuesta demográfica y de salud familiar, ENDES 2008. INEI

FUENTE: (2) Informe del estudio de factibilidad del PARSALUD

(3) Encuesta demográfica y de salud familiar, ENDES 2009. INEI

2.- Avance Físico Cod SNIP 056-2005 Gestión y Monitoreo del Programa

1. Se completaron los arreglos institucionales para la operación plena del PARSALUD II:
 - Instalación y funcionamiento del Comité Directivo
 - Convenios de cooperación institucional entre MINSA y los 9 GR suscritos e implementados
 - Conformación de grupos de tarea regionales
2. Verificación de la viabilidad del Programa
3. Revisión y actualización del MOP
4. Licitación para auditoría externa convocada
5. Línea de base del Programa: Diseño de evaluación y trabajo de campo concluidos. En elaboración de informe final

2.- Avance Físico Cod SNIP 056-2005

Componente I: Fortalecimiento de la Demanda

1. Estrategia de comunicación y educación en salud:
 - Diseño concluido (EPPEs)
 - Validación en curso
 - PIP para implementación elaborado y presentado a OPI MINSA
2. EESS con equipamiento audiovisual: concluido (1,423 EESS)
3. Campaña: Nuestro derecho a identidad y aseguramiento
 - Diseño concluido y validado
 - DT “Promoviendo el derecho a la identificación para el ejercicio al derecho a la salud, en el marco del aseguramiento universal” elaborado y aprobado (RM N° 049-2011/MINSA)
 - Incluido en planes regionales 2011.

2.- Avance Físico Infraestructura

(SNIP: 67623,67932,68101,68162,68114,67776,68060,68102,67514)

4. EESS con infraestructura de atención materno neonatal mejorada

Componentes del Proyecto (productos o resultados)	Indicadores	Unidad de Medida	Meta total vigente {1}	Avance Acumulado {2}	Avance acumulado {3}	Observaciones
Expedientes Técnicos de infraestructura elaborados	# Expedientes Técnicos Elaborados	Expediente Técnico	80	62	78%	62 expedientes técnicos concluidos.
Establecimiento con infraestructura mejorada	# de establecimientos con infraestructura mejorada	Establecimiento	80	1	1%	<ul style="list-style-type: none"> - 1 obra terminada: CS. Andarapa de Andahuaylas - 22 obras en ejecución: Ayacucho (7), Puno (5), Huánuco (7), Ucayali (3) -2 contratos resueltos, Apurímac y Huancavelica . En elaboración nuevos expedientes técnicos: - Contrato suscrito para ejecución obras en 4 EESS de Cusco. -Propuestas en evaluación para ejecución de obras en 6 EESS de Amazonas -2ª Conv Cajamarca (4EESS) convocada -- Puno y Ayacucho 2ª etapa convocados
Obra de infraestructura supervisada	# de obras de infraestructura supervisadas	Obra	80	1	1%	<ul style="list-style-type: none"> - 02 contratos resueltos. En proceso de elaboración de nuevas bases: Apurímac y Huancavelica - Supervisiones en curso: Ayacucho (7), Puno (5), Huánuco (7), Ucayali (3) -Supervisión contratada para 4 EESS Cusco - En evaluación propuestas para Cajamarca - Convocada Ayacucho II; En proceso Puno II y Huánuco II

2.- Avance Físico en Equipamiento

(SNIP: 67623,67932,68101,68162,68114,67776,68060,68102,67514)

5. EESS de red obstétrica con equipos médicos para atención materno infantil entregados

Componentes del Proyecto (productos o resultados)	Indicadores	Unidad de Medida	Meta total vigente {1}	Avance Acumulado {2}	Avance acumulado	Observaciones
Establecimientos de salud con Equipos Médicos	# de establecimientos con equipos médicos	Establecimiento	108	0	0%	<p>- Equipo y mobiliario ya contratado para 23 EESS FONB: Apurímac , Ayacucho y Huancavelica</p> <p>- Bases en espera de N/O para 20 EESS FONB: Puno, Huánuco y Ucayali</p> <p>- Especificaciones técnicas listas y bases en elaboración para EESS FONB en Cusco, Cajamarca y Amazonas</p>

PARSALUD II
Contrataciones obras y equipos al 9 febrero de 2011

		Montos (nuevos soles)	Observaciones	
Contratos en ejecución	Ejecución de obras	Apurimac y Huancavelica	Contratos resueltos. Se elaboraron nuevos expedientes	
		Ayacucho (7 EESS)	17,159,000.00	Obras en ejecución
		Puno (5 EESS)	7,143,106.00	
		Huánuco (7 EESS)	21,720,875.00	
		Ucayali (3 EESS)	10,465,116.00	
		Cusco (4 EESS)	5,422,026.01	Contrato firmado
	Supervisión de obras	Apurimac y Huancavelica	Contratos resueltos. En proceso de elaboración de nuevas bases	
		Ayacucho (7 EESS)	1,056,660.00	Obras en ejecución
		Puno (5 EESS)	649,996.00	
		Huánuco (7 EESS)	1,072,192.00	
		Ucayali (3 EESS)	605,918.00	
		Cusco (4 EESS)	481,634.00	Ya contratado
Subtotal		65,776,523.01		
Licitaciones en Curso	Ejecución de obras	Cajamarca (5 EESS)	15,558,112.00	2a licitación convocada
		Amazonas (6 EESS)	16,120,467.00	Propuestas en evaluación
		Puno 2a etapa (1 FONE, 2FONB)	18,321,984.00	Licitación convocada (9 ene)
		Ayacucho 2a etapa (3 FONE, 1FONB)	8,479,000.00	Licitación convocada
	Supervisión de obras	Cajamarca (5 EESS)	1,202,230.00	En evaluación de propuestas
		Amazonas (6 EESS)	1,053,005.00	Licitación convocada
		Puno 2a etapa (1 FONE, 2FONB)	1,567,368.00	En conformación de lista corta
		Ayacucho 2a et. (3 FONE, 1FONB)	1,567,368.00	Se reciben exp interés el 11 feb
	Equipamiento Apurimac-Huancavelica-Ayacucho		6,634,729.13	Contratos firmados con 11/12 empresas
	Mobiliario y eq. Compl. Apuri-Huancavel-Ayacucho		3,778,026.39	Contratos firmados
Subtotal		74,282,289.52		
Total		140,058,812.53		

PARSALUD II

Licitaciones pendientes al 9 febrero 2011

Licitaciones Pendientes		Monto estimado (Nuevos soles)	Observaciones
Huánuco 2a etapa (4 EESS FONB)	Ejecución de obras	14,740,508.00	Exp técnicos y bases enviados a N/O
	Supervisión de obras	1,061,442.36	Se solicitó N/O a solicitud de propuestas
Huancavelica (7 EESS FONB)	Ejecución de obras	4,099,585.47	Exp técnicos enviados a N/O
	Supervisión de obras	430,046.00	En preparación de bases
Apurímac (6 EESS FONB)	Ejecución de obras	2,610,618.82	Exp técnicos enviados a N/O
	Supervisión de obras	287,824.82	En preparación de bases
Equipamiento Huánuco, Ucayali y Puno		12,281,576.00	En espera de N/O a bases de licitación
Mobiliario de Huánuco, Ucayali y Puno		4,551,470.00	
TOTAL		40,063,071.47	

TOTAL (contratado, licitado y en proceso): NS/. 180,121,884

2.- Avance Físico Cod SNIP 056-2005

Componente II: Mejoramiento de la Oferta

7. Personal de salud capacitado en atención materno neonatal

- Actualización curricular de las pasantías para emergencias obstétricas, neonatales, banco de sangre y laboratorio en elaboración, por presentar producto final.
- PIP de implementación elaborado y enviado formalmente a la OPI MINSA para revisión y aprobación.
- Participación en los Comités de Prevención de Muerte Materna
- AT para la autoevaluación de sedes docentes

2.- Avance Físico Cod SNIP 056-2005

Componente II: Mejoramiento de la Oferta

8. Proyectos de mejora de la calidad de los servicios MI con inclusión de población pobre y dispersa

- Rediseño del Documento Técnico del Sistema de Gestión de Calidad en Salud, actualmente en vías de aprobación
- Se concluyó el rediseño del fondo concursable que financiará los proyectos de mejora de calidad.
- Se elaboró una propuesta (diseño y metodología) para implementar pilotos de Vigilancia Ciudadana en las regiones
- Se está concluyendo la Propuesta para el Centro de atención al usuario del SIS.

2.- Avance Físico Cod SNIP 056-2005

Componente II: Mejoramiento de la Oferta

9. Personal de Salud capacitado en gestión de recursos humanos y manejo de insumos

- Plan curricular del PREG culminado.
- Plan Curricular de DEGIS culminado
- Aplicativo web para automatización de la actualización y sincronización de los catálogos del SISMED y SIGA culminado y en uso en 85 UE
- AT a las DIREMID en análisis de la disponibilidad de medicamentos estratégicos
- AT a la programación y formulación presupuestal 2011 a nivel de UE (desarrollo e implementación del Instrumento de Programación de metas físicas en Ayacucho, Huánuco y Ucayali).

2.- Avance Físico Cod SNIP 056-2005

Componente III: Gobierno y Financiamiento

11. Normas y disposiciones legales para mejorar la eficiencia y equidad en el sistema de salud, propuestas

- Propuesta de Reglamento de la Ley Marco de Aseguramiento Universal. En base a dicha propuesta el DS 008-2010-SA aprobó el mencionado Reglamento en el mes de abril de 2010.
- Lineamientos de políticas de participación y vigilancia Ciudadana. Aprobados por RM
- Propuesta de Norma técnica sobre Funciones Obstétricas y Neonatales
- Manual y Guía de Inspección de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Farmacéuticos y el Manual de Validaciones
- Propuesta de Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASA
- DT Derecho a la Identidad y Aseguramiento, aprobado por RM.

2.- Avance Físico Cod SNIP 056-2005

Componente III: Gobierno y Financiamiento

11. Normas y disposiciones legales para mejorar la eficiencia y equidad en el sistema de salud, propuestas (continuación)

- Revisión y análisis del marco normativo nacional en salud acorde a la normatividad de funciones transferidas
- En elaboración:
 - Propuesta de Reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios
 - Identificador estándar para insumos y dispositivos médicos
 - Propuesta de operación de la atención integral de salud en el primer nivel de atención
 - Adecuación y actualización normativa para el cumplimiento de los objetivos del Seguro Integral de Salud - SIS en el marco del Aseguramiento Universal en Salud
 - Propuesta de documentos de gestión del SIS: ROF y CAP.

2.- Avance Físico Cod SNIP 056-2005

Componente III: Gobierno y Financiamiento

12. Sistema de seguimiento de la regulación, de la prestación y el financiamiento de salud, diseñados.

- Se rediseñó el Documento Técnico del Sistema de Gestión de Calidad en Salud.
- Se culminó la Sistematización de la evaluación del ejercicio de las funciones transferidas a las regiones, en base a la aplicación del instrumento MED.

2.- Avance Físico Cod SNIP 056-2005

Componente III: Gobierno y Financiamiento

13. Informes de evaluaciones periódicos que garantizan el nivel de desempeño óptimo del sistema de salud, realizados

- AT para el diseño de la propuesta de evaluación de resultados y monitoreo de las actividades de implementación del AUS
- Apoyo SIS para apuntalar su sistema de información, con las siguientes consultorías:
 - Mejora de la explotación de la base de datos del SIS para fortalecer su capacidad de gestión
 - Reestructuración de la bases de Datos del SIS
 - Actualización del ARFSIS.

3.- Cronograma de Ejecución

Componentes de Inversión	Periodo de Intervención del PARSALUD II																							
	Primera Etapa ET				Segunda Etapa ET																			
	2009				2010				2011				2012				2013				2014			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Elaboración de Expedientes Técnicos	[Gantt chart showing execution bars for technical files preparation]																							
Primer Grupo: FONB	[Gantt chart bar]																							
Primer Grupo: FONE	[Gantt chart bar]																							
Segundo Grupo: FONB	[Gantt chart bar]																							
Segundo Grupo: FONE	[Gantt chart bar]																							
Tercer Grupo: FONB	[Gantt chart bar]																							
Tercer Grupo: FONE	[Gantt chart bar]																							
Obras de Infraestructura y Supervisión	[Gantt chart showing execution bars for infrastructure and supervision works]																							
Primer Grupo:	[Gantt chart bar]																							
Segundo Grupo:	[Gantt chart bar]																							
Tercer Grupo:	[Gantt chart bar]																							
Equipamiento de capacitación	[Gantt chart showing execution bars for training equipment]																							
Equipamiento médico	[Gantt chart showing execution bars for medical equipment]																							
Mobiliario médico y complementario	[Gantt chart showing execution bars for medical furniture and complementary]																							
Inversiones No Financieras Intangibles	[Gantt chart showing execution bars for non-financial intangible investments]																							
Unidad Coordinación del Programa	[Gantt chart bar]																							
Fortalecimiento Demanda en salud	[Gantt chart bar]																							
Mejoramiento Oferta en salud	[Gantt chart bar]																							
Gobierno y Financiamiento salud	[Gantt chart bar]																							
Ejecución Proyectada	4,386				10,041				79,803				49,198				16,289				2,666			

Total Presupuesto del PARSALUD II (2009-2014) = US\$ 162 383 024,00

4. Avance Financiero por Fuente de Financiamiento (1)

En miles de US\$

Fuentes de Financiamiento	Costo Total Estudio de Factibilidad	Ejecución Acumulada al 2010	PIA 2011	Saldo de Balance		Ejecutado Ene 2011		Proyecc. ejecución Dic 2011
				ROOC ¹		Compromiso	Devengado	
				BID	BM			
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	30,000	2,267	9,951	555	117	1,241	492	9,951
RECURSOS ORDINARIOS	132,383	12,160	69,852	0	0	20,556	836	69,852
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general	162,383	14,427	79,803	555	117	21,797	1,328	79,803

1. En trámite

Resultado del ejercicio 2010

PIM	35,745
EJECUTADO	10,041
% AVANCE	28.09%

* Tipo de cambio utilizado: S/.2.82 por US Dólar

4. Avance Financiero por Componente (2)

En miles de US\$

Componente	Costo Total Estudio de Factibilidad	Ejecución Acumulada al 2010	PIA 2011	Saldo de Balance ROOC ¹		Ejecución al 31 ene 2011		Proyección Ejecución a Dic 2011
				BID	BM	Compromiso	Devengado	
I. DEMANDA	5,976	1,450	1,600	-	-	275	8	1,600
II. OFERTA	142,253	8,564	75,280	555	117	19,983	1,193	75,280
III. GOBIERNO Y FINANCIAMIENTO	5,189	426	646	-	-	158	5	646
IV. ADMINISTRACION	8,965	3,987	2,277	-	-	1,381	122	2,277
Total general	162,383	14,427	79,803	555	117	21,797	1,328	79,803

1. En trámite

* Tipo de cambio utilizado: S/.2.82 por US Dólar

5. Programa de Desembolsos 2011 Fuente ROOC

BID

Componente	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL	
	US \$	Nuevos Soles S/.	US \$	Nuevos Soles S/.	US \$	Nuevos Soles S/.	US \$	Nuevos Soles S/.	US \$	Nuevos Soles S/.
I. DEMANDA	75	212	78	221	61	172	35	99	249	704
II. OFERTA	878	2,475	1,331	3,752	1,586	4,472	474	1,336	4,269	12,035
III. GOBIERNO Y FINANCIAMIENTO	193	545	112	315	107	301	33	92	445	1,253
IV. ADMINISTRACION	0	0	14	38	0	0	0	0	14	38
Total general	1,146	3,232	1,535	4,326	1,754	4,945	542	1,527	4977	14,030

BM

Componente	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL	
	US \$	Nuevos Soles S/.	US \$	Nuevos Soles S/.	US \$	Nuevos Soles S/.	US \$	Nuevos Soles S/.	US \$	Nuevos Soles S/.
I. DEMANDA	202	570	348	981	545	1,537	256	721	1,351	3,809
II. OFERTA	635	1,791	698	1,967	1,607	4,532	470	1,325	3,410	9,616
III. GOBIERNO Y FINANCIAMIENTO	44	124	60	168	59	165	39	110	202	567
IV. ADMINISTRACION	0	0	14	38	0	0	0	0	14	38
Total general	881	2,485	1,120	3,154	2,211	6,234	765	2,156	4,977	14,030

6. Programación Multianual por Fuente de Financiamiento

En miles de US\$

Fuentes de Financiamiento	Costo Total Estudio de Factibilidad	Ejecución Acumulada al 2010	PIA 2011	Saldo de Balance		Ejecutado Ene 2011		Proyecc. ejecución Dic 2011
				ROOC ¹		Compromiso	Devengado	
				BID	BM			
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	30,000	2,267	9,951	555	117	1,241	492	9,951
RECURSOS ORDINARIOS	132,383	12,160	69,852	0	0	20,556	836	69,852
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general	162,383	14,427	79,803	555	117	21,797	1,328	79,803


* Tipo de cambio utilizado: S/.2.82 por US Dólar

6. Programación Multianual por Componente (en miles de US \$)

Componente	Acumulado al 2010	PROGRAMACION MULTIANUAL				Programación acumulada 5 años	Monto Aprobado (En el contrato de préstamo o estudio que sustenta la viabilidad)
		2011	2012	2013	2014		
I. DEMANDA	1,450	1,600	1,050	1,469	407	5,976	5,976
II. OFERTA	8,564	75,280	45,820	11,894	695	142,253	142,253
III. GOBIERNO Y FINANCIAMIENTO	426	646	1,313	1,873	931	5,189	5,189
IV. ADMINISTRACION	3,987	2,277	1,015	1,054	632	8,965	8,965
Total general	14,427	79,803	49,198	16,290	2,665	162,383	162,383

* Tipo de cambio utilizado: S/.2.82 por US Dólar

Proyección de ejecución acumulada (US \$)

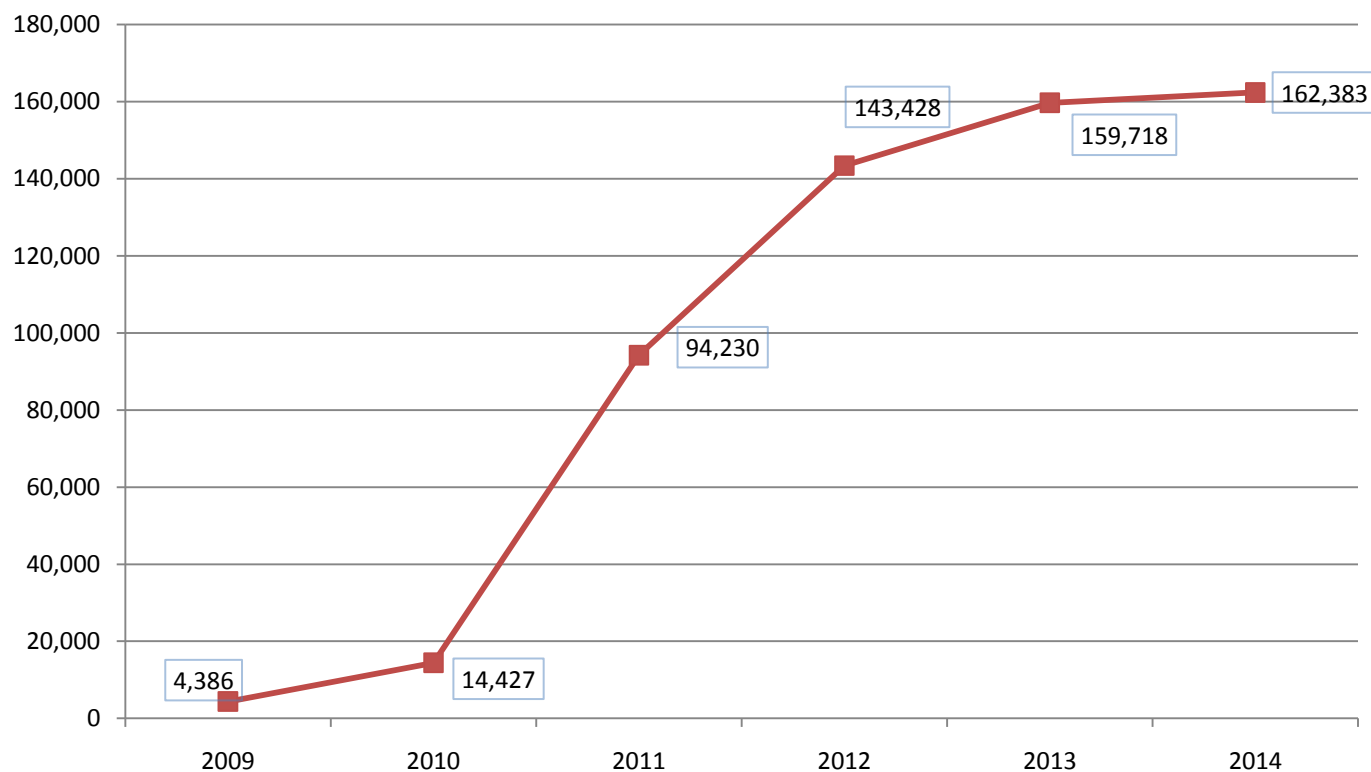

PARSALUD II - EJECUCIÓN AL 9 FEBRERO 2011

(Nuevos Soles)

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución			Avance %
			Compromiso	Devengado	Girado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	196,983,345	196,983,345	64,218,243	2,387,267	2,386,198	1.2
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	28,061,100	28,061,100	3,986,791	1,456,660	1,441,660	5.2
TOTAL	225,044,445	225,044,445	68,205,034	3,843,927	3,827,858	1.7

Fuente: MEF - Consulta amigable SIAF

PARSALUD II - AVANCE COMPROMISO PAC AL 9 FEBRERO 2011

(Nuevos soles)

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	PAC*	Compromiso	Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS	196,983,345	196,983,345	132,542,246	64,218,243	48.5
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	28,061,100	28,061,100	28,061,100	3,986,791	14.2
TOTAL	225,044,445	225,044,445	160,603,346	68,205,034	42.5

Fuente: MEF - Consulta amigable SIAF

* SIAF al 8 febrero 2011

7. Problemas y Plan de Acción

Problemas relevantes, oportunidades o riesgos para el proyecto	Acciones específicas y relevantes	Instancia responsable de implementarla	Fecha estimada de implementación
1. Incumplimiento de contratistas y supervisores de dos regiones requirieron resolver sendos contratos	Elaborar un plan de mitigación de riesgos para los procesos de licitación de obras.	PARSALUD	En proceso
2. Se ha detectado caso de corrupción en una contratista al falsificar firma de residente de obra			
3. Al no atenderse las solicitudes de reembolso se genera la necesidad de re estructurar financiamiento de deuda para ambos bancos	Se propone una nueva estructura de financiamiento	PARSALUD - BID _ BM - DNEP	I Trimestre
4. Persiste demora en respuesta a solicitudes de No Objeción por parte de BM	En reunión conjunta, BM se ha comprometido a hacer seguimiento estrecho de las solicitudes que envíe al Programa.	BM	En proceso
5. Se requiere recomponer el Comité Directivo por la elección de nuevas autoridades regionales.	Se ha oficiado a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales para la designación de miembros Titular y alterno para el Comité.	PARSALUD	I Trimestre
6. Alza de costos de construcción incrementan presupuesto requerido para obras	Evaluar incremento de presupuesto	PARSALUD MEF	III Trimestre
7. Lluvias inusuales ocasionarán retardos en ejecución de obras.	Considerar nuevos cronogramas de entrega	PARSALUD	I trimestre

Modificación propuesta a estructura de financiamiento

Redistribuye el 50% de los componentes I y III al componente II,
para infraestructura y equipo (US \$)

	BID	BIRF	Local	Total
Administración			5,750,447	5,750,447
Costos Directos	14,746,277	14,746,277	123,925,577	153,417,555
2,1 Fortalecimiento de la Demanda	1,493,894	1,493,894	2,987,788	5,975,576
2,1,1 Entornos saludables	1,360,500	1,360,500	2,721,000	5,442,000
2,1,2 Identificación Pro-derechos	133,394	133,394	266,787	533,575
2,2 Mejoramiento de la Oferta	11,955,029	11,955,029	118,343,082	142,253,140
2,2,1 Establecimientos de Buena Calidad	8,527,867	8,527,867	118,206,805	135,262,540
2,2,2 Redes Eficientes	3,427,162	3,427,162	136,277	6,990,600
2,3 Gobierno y Financiamiento	1,297,354	1,297,354	2,594,708	5,189,416
2,3,1 Articulación del Sector Salud	315,900	315,900	631,800	1,263,600
2,3,2 Regulación prestación salud	451,750	451,750	903,500	1,807,000
2,3,3 Regulación del Financiamiento	529,704	529,704	1,059,408	2,118,816
Monitoreo, Evaluación y Auditoría	253,723	253,723	2,707,000	3,214,446
3,1 Sistema de monitoreo y evaluaciones	118,223	118,223	2,707,000	2,943,446
3,2 Financiamiento auditorías	135,500	135,500	-	271,000
TOTAL	15,000,000	15,000,000	132,383,024	162,383,024

8. Lecciones aprendidas

- En el caso de obras es necesario supervisar al supervisor. Ese presupuesto, adicional al contemplado en el proyecto, incrementa los gastos operativos.
- Procesos de licitación conjuntos dilatan mucho los tiempos de revisión para no objeciones.
- El mercado de la construcción no es homogéneo, obligando a tener un mayor cuidado en la selección del contratista.
- El ruido electoral regional y local originó dificultades en la programación y ejecución de actividades, se vienen previendo acciones para evitar sucesos similares con motivo de las próximas elecciones nacionales.



GRACIAS

pgiusti@parsalud.gob.pe
